INFORMACJA PÓŁROCZNA

Z REALIZACJI WYBRANYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ

GMINĘ BORNE SULINOWO

W 2014 ROKU

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
Referat Inwestycyjny

stan na dzień 30.06.2014 r.

„ Budowa chodnika w m. Dąbie”

Zakres inwestycji:

- budowa chodnika w miejscowości Dąbie na długości 218 m i szerokości 1,20 m. Łączna powierzchnia utwardzenia (wliczając obrzeża i krawężniki) wyniosła 315 m^2. Na wszystkich wjazdach ułożono kostkę brukową betonową gr. 8 cm,
- przełożenie zapadniętych fragmentów jezdni brukowej w ilości około 20 m^2,
- uzupełnienie nawierzchni parkingu i pobocza mieszanką z kruszywa drogowego 0-31,5mm w ilości 20 ton.

Budowa chodnika w m. Dąbie

„ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szybu dźwigowego z platformą do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie”

Zakres planowanej inwestycji:

- przebudowa okien na drzwi wejściowe,
- wykonanie fundamentów platformy,
- montaż platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (w przeszklonym szybie), przylegającej do elewacji frontowej budynku,
- obniżenie istniejącego chodnika w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do platformy.

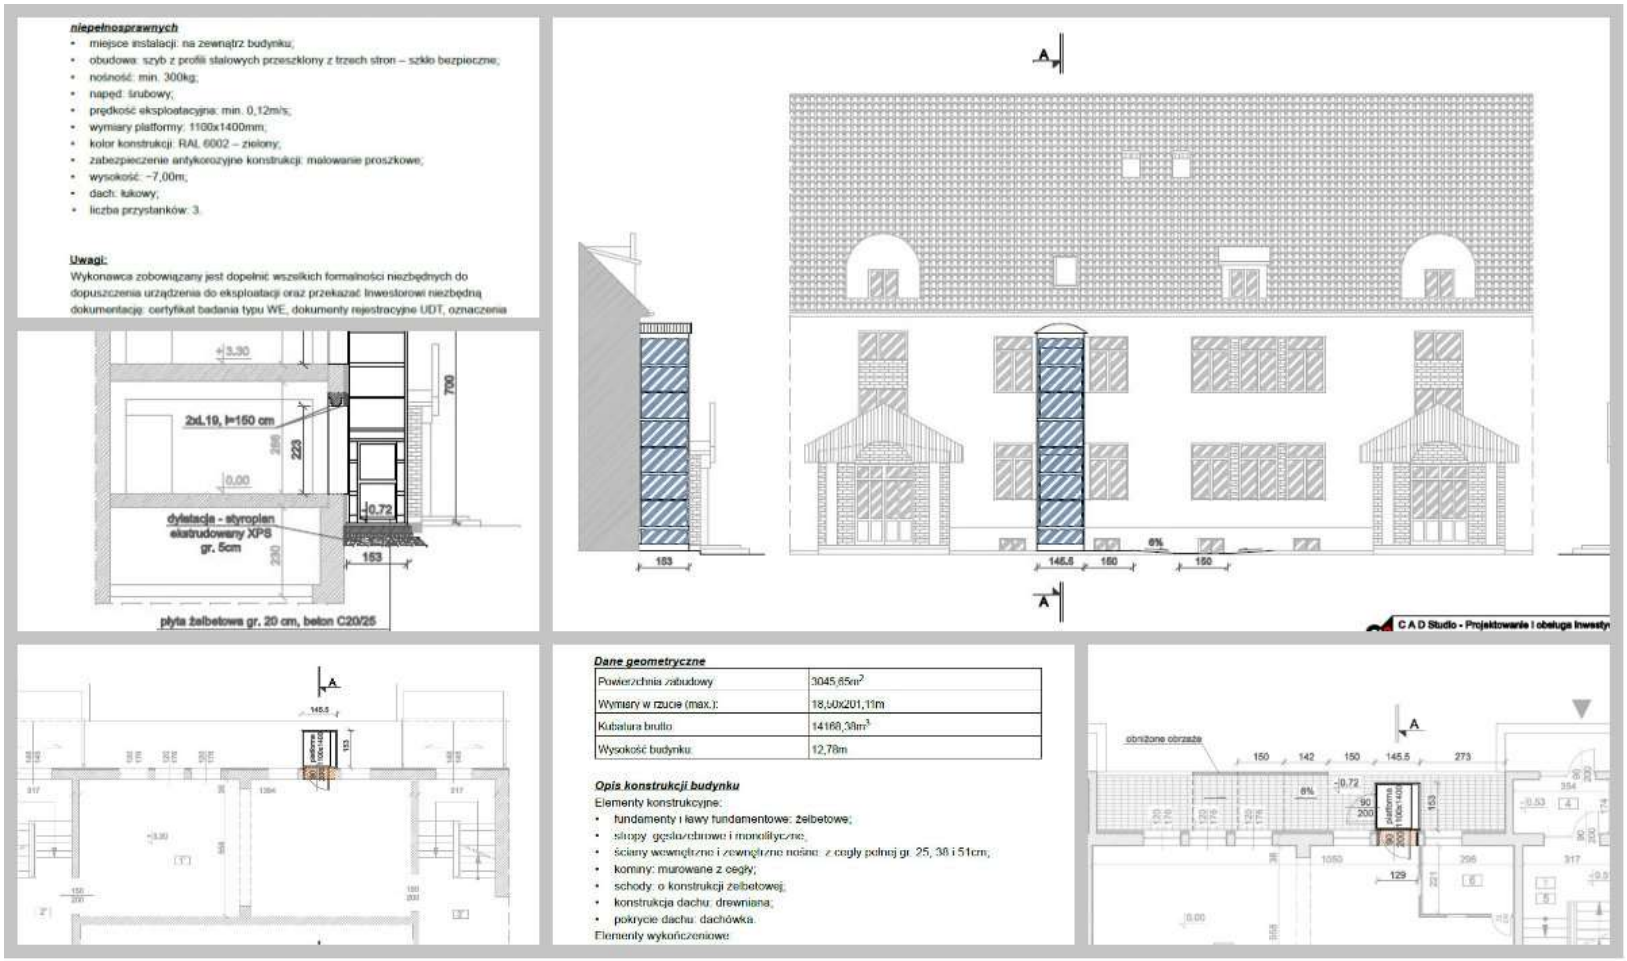

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szybu dźwigowego z platformą do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie

„ Remont chodnika przy ul. M. Konopnickiej 17 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika,
- wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok 130 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
- obramowanie chodnika obrzeżami 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej,
- regulacja pokryw studni kanalizacyjnych.

Remont chodnika przy ul. M. Konopnickiej 17 w Bornem Sulinowie

„ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 62/5 obręb Przyjezierze, gm. Borne Sulinowo”

Zakres planowanej inwestycji:

- usunięcie humusu w miejscu projektowanej nawierzchni,
- wykonanie fundamentów pod urządzenia,
- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw (zestawu zabawowego, huśtawki dwusiedziskowej, huśtawki wagowej, bujaka na sprężynie),
- montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem),
- wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzeniami.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 62/5 obręb Przyjezierze, gm. Borne Sulinowo

„ Utwardzenie płytami betonowymi ulicy Wrzosowej w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- mechaniczne zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm – powierzchnia około 300 m^2,
- profilowanie i wyrównanie terenu – powierzchnia około 300 m^2,
- ułożenie płyt betonowych o wymiarach 0,75x1,0x0,12 m na podsypce piaskowej w ilości około 400 szt.

Utwardzenie płytami betonowymi ulicy Wrzosowej w Bornem Sulinowie

„Budowa chodnika w m. Kiełpino – II etap budowy”

Zakres inwestycji:

Inwestycja stanowiła kolejny etap budowy chodnika w miejscowości Kiełpino. I etap prac, w zakres których weszła budowa 200 m chodnika, ukończono w 2013 roku. II etap inwestycji objął wykonanie 240 m chodnika.

Zakres prac był następujący:

- korytowanie nawierzchni istniejącej,
- zagęszczenie gruntu rodzimego,
- ustawienie obrzeży chodnikowych oraz krawężników na ławie betonowej,
- wykonanie warstwy odsączającej oraz podsypkowej,
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Budowa chodnika w m. Kiełpino – II etap budowy

„ Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do budynku świetlicy w m. Krągi”

Zakres inwestycji:

- rozebranie istniejącej nawierzchni,
- korytowanie, profilowanie i wyrównanie terenu,
- wykonanie fundamentów pochylni,
- wykonanie dojścia do budynku, schodów terenowych oraz nawierzchni pochylni z kostki brukowej betonowej,
- montaż balustrad,
- wykonanie nawierzchni trawiastej.

Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do budynku świetlicy w m. Krągi

„Wykonanie ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych naprzeciwko budynku wielorodzinnego przy ul. Fryderyka Chopina 6 – wraz ze wspólnotą mieszkaniową”

Zakres inwestycji w ramach umowy porozumienia:

- zdjęcie warstwy humusu,
- zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa budowlanego gr. 15 cm,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
- ułożenie nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni około 150 m^2,
- regulacja krawężników kamiennych około 32 m,
- ustawienie krawężników betonowych – 41 m.

Wykonanie ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych naprzeciwko budynku wielorodzinnego przy ul. Fryderyka Chopina 6 – wraz ze wspólnotą mieszkaniową

„Remont chodnika przy ul. Chopina 11 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

- rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika,
- wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),
- regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej,
- wykonanie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok 125 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (na zjazdach gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Remont chodnika przy ul. Chopina 11 w Bornem Sulinowie

„Remont chodnika przy ul. Słonecznej 2 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika,
- regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej,
- ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości 77 m,
- ustawienie obrzeży 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości 37 m,
- wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 134 m z kostki brukowej betonowej o gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Remont chodnika przy ul. Słonecznej 2 w Bornem Sulinowie

„ Renowacja podłogi sportowej w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 21”

Zakres inwestycji :

- cyklinowanie podłogi sportowej, drobne naprawy polegające na wzmocnieniu klepek podłogowych, podkład + 2x lakierowanie z użyciem poliuretanowych lakierów na obiekty sportowe spełniającymi wymagania antypoślizgowe oraz higieniczne,
- malowanie linii boisk według obowiązujących przepisów gier sportowych. Malowanie z użyciem farb poliuretanowych, dwuskładnikowych na wierzchniej warstwie lakieru.

Renowacja podłogi sportowej w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 21

„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika,
- regulacja istniejącego krawężnika granitowego ułożonego na ławie betonowej,
- ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 177 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (na zjazdach gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika
przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie

„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo”

Zakup i montaż ogrodzenia drewnianego o parametrach:

- ogrodzenie placu zabaw długości **60 m**,
- wysokość ogrodzenia **80 cm**,
- sztacheta **20x90 mm**,
- rygiel **2x20x60 cm**,
- drewno zaimpregnowane środkiem grzybo- i owadobójczym.

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo

„Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 obręb Juchowo”

Przedmiot zadania (w trakcie realizacji):

Rozbiórka budynku gospodarczego o konstrukcji murowanej, parterowego z poddaszem użytkowym, posadowionego na fundamentach kamiennych, posiadającego ściany murowane z cegły, więźbę dachową drewnianą, dach dwuspadowy kryty dachówką, strop między kondygnacyjny drewniany. Powierzchnia zabudowy budynku 112 m².

Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 obręb Juchowo

„ Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika wraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji (w trakcie realizacji):

- rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika,
- rozebranie nawierzchni asfaltowej na szerokość jezdni i długość progu zwalniającego,
- regulacja istniejącego krawężnika granitowego na ławie betonowej, wypełnienie ponadnormatywnych szczelin miedzy krawężnikami zaprawą,
- ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego kruszonego gr. 10cm,
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 108 m z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm,
- wykonanie progu zwalniającego z nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie betonowej,
- wykonanie oznakowania poziomego P-25 z kostki brukowej koloru białego,
- ustawienie oznakowania pionowego.

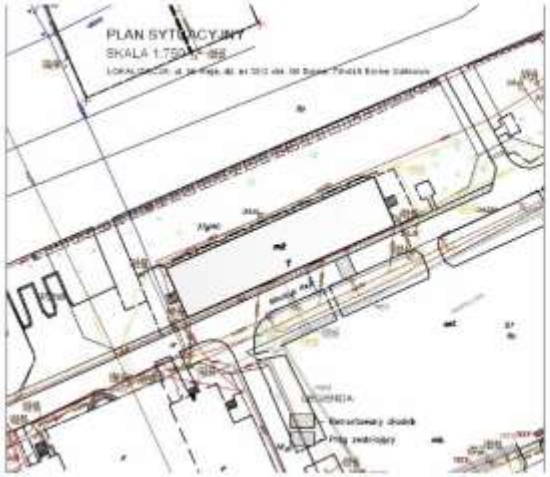

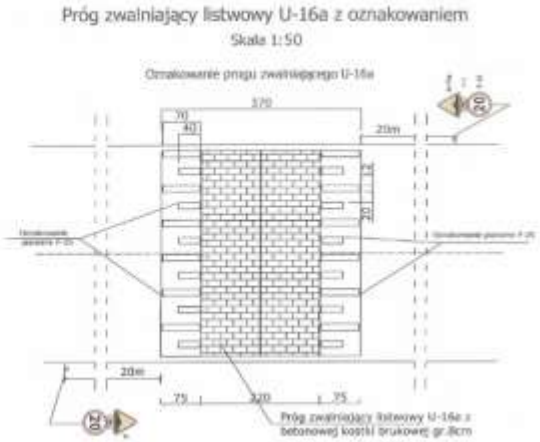

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika wraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowie

„Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. Łączno”

Zakres inwestycji:

Zadanie było kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2013 r., w ramach której wykonano fundamenty, konstrukcję drewnianą wiaty oraz pokrycie dachu dwuspadowego z papy termozgrzewalnej podkładowej. Zamontowano również obróbki blacharskie okapu oraz szczytów dachu.

Aktualne zadanie polegało na:

- zakupie oraz dostawie w miejsce inwestycji gontu bitumicznego,
- ułożeniu gontu bitumicznego na dachu wiaty rekreacyjnej,
- uprzątnięciu terenu po zakończeniu prac budowlanych.

Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. Łączno

„Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

- montaż kamer w 2 lokalizacjach: Al. Niepodległości (naprzeciw Centrum Kultury i Rekreacji oraz na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Zielonej).

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem Sulinowie

„Roboty budowlane związane z wykonaniem sześciu progów zwalniających listwowych U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji (w trakcie realizacji):

- rozebranie nawierzchni asfaltowej na szerokość jezdni i długość progów zwalniających,
- wykonanie progów zwalniających o nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie betonowej gr. 10÷20 cm,
- wykonanie oznakowania poziomego P-25 z kostki brukowej betonowej koloru białego,
- ustawienie oznakowania pionowego.

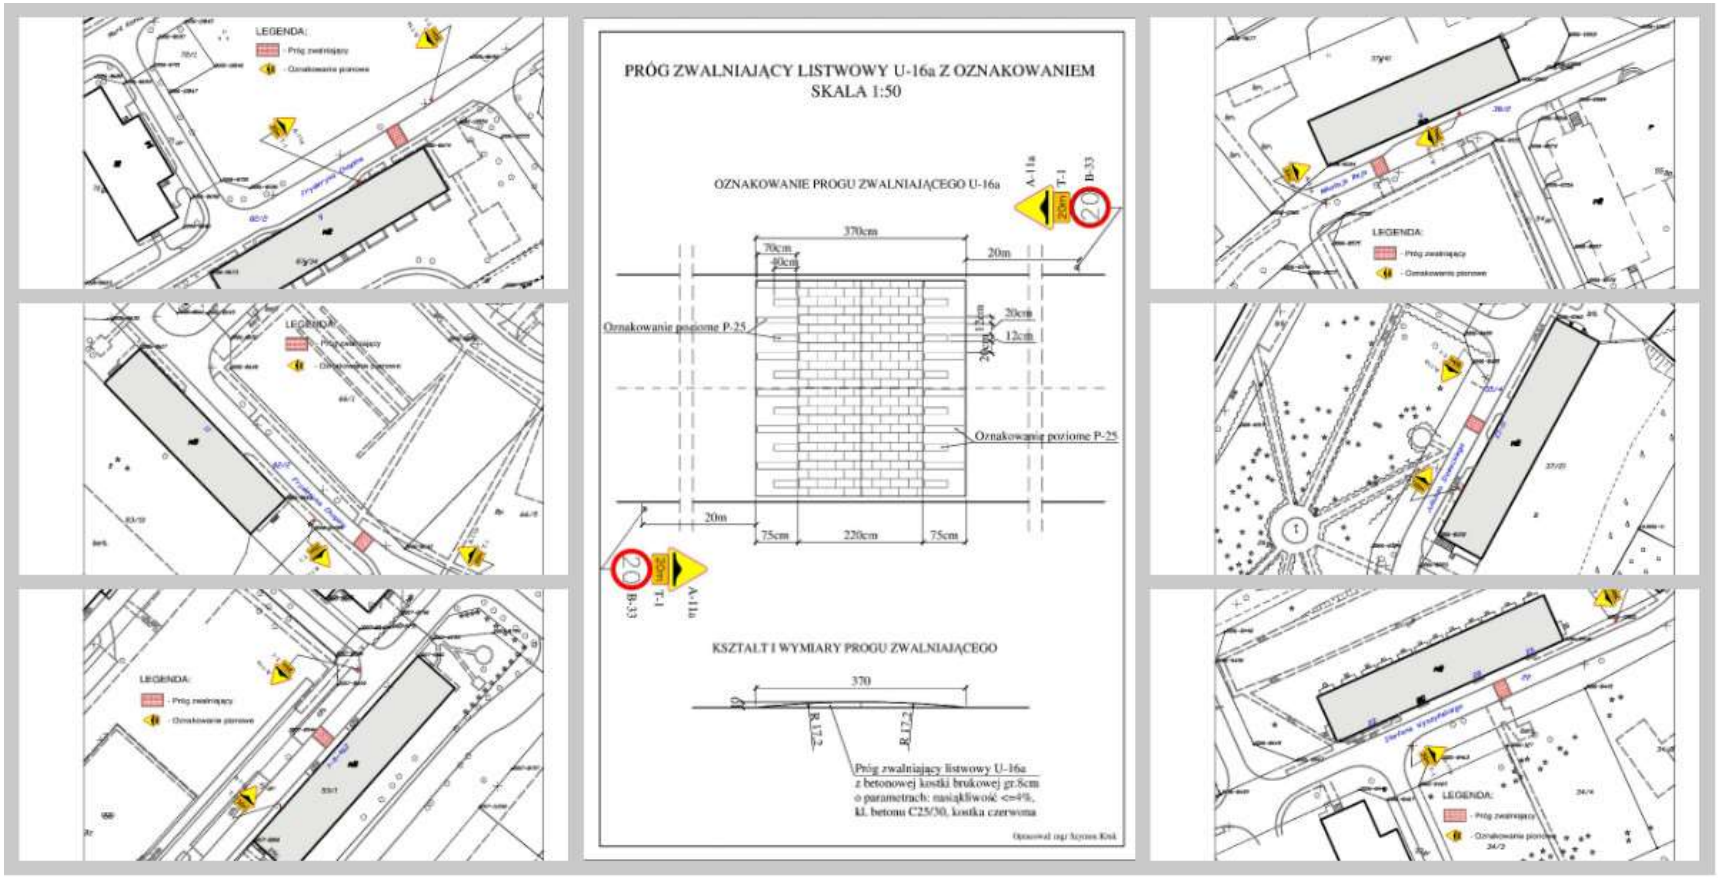

Roboty budowlane związane z wykonaniem sześciu progów zwalniających listwowych U-16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie
